PS2026-1 May Shutdown Schedule

ID	Notes	Work Order	Equipment	Task Name	Duration	Start	Finish
148				**KPP PS2026-1 MAY PLANT SHUT**	**234.5 hrs**	**Thu 14/05/26 7:00 AM**	**Sun 24/05/26 1:30 AM**
672				**AREA 2 SHUTDOWN SEQUENCE**	**64 hrs?**	**Sun 17/05/26 5:00 AM**	**Tue 19/05/26 9:00 PM**
844				**A2 Isolations**	**43 hrs**	**Mon 18/05/26 2:00 AM**	**Tue 19/05/26 9:00 PM**
845				**Unit 400 Isolations**	**43 hrs**	**Mon 18/05/26 2:00 AM**	**Tue 19/05/26 9:00 PM**
858		4, 20036919	7121_B405B	Spade B SFD CSE	6 hrs	Tue 19/05/26 2:15 AM	Tue 19/05/26 8:15 AM
867				**Unit 500 Isolations**	**29.75 hrs**	**Mon 18/05/26 9:00 AM**	**Tue 19/05/26 2:45 PM**
879		5, 20060718	7121_E5501E	Spade E5501 & E501	6 hrs	Tue 19/05/26 2:45 AM	Tue 19/05/26 8:45 AM
954				**MAINTENANCE TOOL TIME**	**105.5 hrs**	**Mon 18/05/26 3:00 AM**	**Fri 22/05/26 12:30 PM**
1101				**SD PACK: 2.4 - Purification**	**49 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Thu 21/05/26 7:00 AM**
1102		**20032664**	**7121_E215A**	**REPLACE SECTION OF COOLING WATER LINE (SRG)**	**6 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Tue 19/05/26 12:00 PM**
1103		20032664	7121_E215A	CUT AND REMOVE SPOOL	1 hr	Tue 19/05/26 6:00 AM	Tue 19/05/26 7:00 AM
1104		20032664	7121_E215A	INSTALL AND WELD SPOOLS	2 hrs	Tue 19/05/26 7:00 AM	Tue 19/05/26 9:00 AM
1105		20032664	7121_E215A	NDT OF THE WELDS	1 hr	Tue 19/05/26 9:00 AM	Tue 19/05/26 10:00 AM
1106		20032664	7121_E215A	CLEAN AND PAINT ON THE WELDS	2 hrs	Tue 19/05/26 10:00 AM	Tue 19/05/26 12:00 PM
1107		**20060594**	**7121_E215A**	**Steam Leak on Utility station 215 (SRG)**	**5 hrs**	**Tue 19/05/26 9:00 AM**	**Tue 19/05/26 2:00 PM**
1108		20060594	7121_E215A	REPLACE PASSING VALVE.	3 hrs	Tue 19/05/26 9:00 AM	Tue 19/05/26 12:00 PM
1109		20060594	7121_E215A	NDT OF THE WELDS AND PAINT	2 hrs	Tue 19/05/26 12:00 PM	Tue 19/05/26 2:00 PM
1196				**SD PACK: 2.7 - Common Chlorination**	**40 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Wed 20/05/26 10:00 PM**
1201		**20056485**	**121_100TC2E124**	**REPLACE SECTION OF LINE FOR THINNING (SRG)**	**12 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Tue 19/05/26 6:00 PM**
1202		20056485	121_100TC2E124	CUT AND REMOVE THE THINNING SPOOL	3 hrs	Tue 19/05/26 6:00 AM	Tue 19/05/26 9:00 AM
1203		20056485	121_100TC2E124	INSTALL AND WELD THE NEW SPOOL	4 hrs	Tue 19/05/26 9:00 AM	Tue 19/05/26 1:00 PM
1204		20056485	121_100TC2E124	NDT OF THE WELDS	2 hrs	Tue 19/05/26 1:00 PM	Tue 19/05/26 3:00 PM
1205		20056485	121_100TC2E124	CLEAN AND PAINT THE WELDS.	3 hrs	Tue 19/05/26 3:00 PM	Tue 19/05/26 6:00 PM
1206		**20049131**	**7121_40SH20018**	**U200 LP steam manual valve broken(V7690) (SRG)**	**11 hrs**	**Tue 19/05/26 1:00 PM**	**Wed 20/05/26 12:00 AM**
1207		20049131	7121_40SH20018	REMOVE LAGGING FROM VALVE.	1 hr	Tue 19/05/26 1:00 PM	Tue 19/05/26 2:00 PM
1208		20049131	7121_40SH20018	CUT VALVE FROM THE LINE	2 hrs	Tue 19/05/26 2:00 PM	Tue 19/05/26 4:00 PM
1209		20049131	7121_40SH20018	Install weld manual valve broken(V7690)	4 hrs	Tue 19/05/26 4:00 PM	Tue 19/05/26 8:00 PM
1210		20049131	7121_40SH20018	NDT of the welds.	1 hr	Tue 19/05/26 8:00 PM	Tue 19/05/26 9:00 PM
1211		20049131	7121_40SH20018	Clean and paint the welds	1 hr	Tue 19/05/26 9:00 PM	Tue 19/05/26 10:00 PM
1212		20049131	7121_40SH20018	Refit Lagging on the valve.	2 hrs	Tue 19/05/26 10:00 PM	Wed 20/05/26 12:00 AM
1213		**20058646**	**121_200CL2C004**	**REPLACE SECTION OF SPOOL DUE TO THINNING (SR**	**13 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Tue 19/05/26 7:00 PM**
1214		20058646	121_200CL2C004	CUT SECTION OF SPOOL DUE TO THINNING	4 hrs	Tue 19/05/26 6:00 AM	Tue 19/05/26 10:00 AM
1215		20058646	121_200CL2C004	INSTALL AND WELD THE NEW SPOOL	6 hrs	Tue 19/05/26 10:00 AM	Tue 19/05/26 4:00 PM
1216		20058646	121_200CL2C004	NDT OF THE WELDS	1 hr	Tue 19/05/26 4:00 PM	Tue 19/05/26 5:00 PM
1217		20058646	121_200CL2C004	CLEAN AND PAINT THE SPOOL	2 hrs	Tue 19/05/26 5:00 PM	Tue 19/05/26 7:00 PM
1218		**20049132**	**7121_40SH20019**	**U200 LP steam bypass seized closed (SRG)**	**10 hrs**	**Tue 19/05/26 4:00 PM**	**Wed 20/05/26 2:00 AM**
1219		20049132	7121_40SH20019	REMOVE LAGGING FROM VALVE.	1 hr	Tue 19/05/26 4:00 PM	Tue 19/05/26 5:00 PM
1220		20049132	7121_40SH20019	CUT VALVE FROM THE LINE	2 hrs	Tue 19/05/26 5:00 PM	Tue 19/05/26 7:00 PM
1221		20049132	7121_40SH20019	Install weld manual valve	4 hrs	Tue 19/05/26 7:00 PM	Tue 19/05/26 11:00 PM
1222		20049132	7121_40SH20019	NDT of the welds.	1 hr	Tue 19/05/26 11:00 PM	Wed 20/05/26 12:00 AM
1223		20049132	7121_40SH20019	Clean and paint the welds	1 hr	Wed 20/05/26 12:00 AM	Wed 20/05/26 1:00 AM
1224		20049132	7121_40SH20019	Refit Lagging on the valve.	1 hr	Wed 20/05/26 1:00 AM	Wed 20/05/26 2:00 AM
1303	**ne start**			**SD PACK: 3.1 - Oxidiser Feed Preparation**	**47.5 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Thu 21/05/26 5:30 AM**
1304		**20034237**	**7121_E3301C**	**V12625 passing steam valve (SRG)**	**14.5 hrs**	**Wed 20/05/26 6:00 AM**	**Wed 20/05/26 8:30 PM**
1305		20034237	7121_E3301C	REMOVE LAGGING FROM THE VALVE	2 hrs	Wed 20/05/26 6:00 AM	Wed 20/05/26 8:00 AM
1306		20034237	7121_E3301C	LIFT GRIDMESH TO ACCESS ISO V12612	1 hr	Wed 20/05/26 8:00 AM	Wed 20/05/26 9:00 AM
1308		20034237	7121_E3301C	CUT AND REMOVE VALVE V12625	2 hrs	Wed 20/05/26 10:00 AM	Wed 20/05/26 12:00 PM
1309		20034237	7121_E3301C	INSTALL AND WELD NEW VALVE	3 hrs	Wed 20/05/26 12:00 PM	Wed 20/05/26 3:00 PM
1310		20034237	7121_E3301C	NDT OF THE WELDS	1 hr	Wed 20/05/26 3:00 PM	Wed 20/05/26 4:00 PM
1311		20034237	7121_E3301C	CLEAN AND PAINT THE WELDS	1 hr	Wed 20/05/26 4:00 PM	Wed 20/05/26 5:00 PM
1312		20034237	7121_E3301C	REFIT LAGGING ON THE VALVE.	2 hrs	Wed 20/05/26 5:00 PM	Wed 20/05/26 7:00 PM
1314		20034237	7121_E3301C	REFIT GRIDMESH	1 hr	Wed 20/05/26 7:30 PM	Wed 20/05/26 8:30 PM
1465	**ART UP**			**SD PACK: 3.4 - Recycle Gas Scrubbing & Compression**	**43.5 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Wed 20/05/26 1:30 AM**
1466		**20043280**	**121_200CL2A004**	**REPLACE ELBOW SECTION DUE TO THINNING (SRG)**	**12 hrs**	**Tue 19/05/26 6:00 AM**	**Tue 19/05/26 6:00 PM**
1467		20043280	121_200CL2A004	CUT AND REMOVE OLD SPOOL	3 hrs	Tue 19/05/26 6:00 AM	Tue 19/05/26 9:00 AM
1468		20043280	121_200CL2A004	INSTALL AND WELD NEW SPOOL	5 hrs	Tue 19/05/26 9:00 AM	Tue 19/05/26 2:00 PM
1469		20043280	121_200CL2A004	NDT to test the new welds on the spool.	2 hrs	Tue 19/05/26 2:00 PM	Tue 19/05/26 4:00 PM
1470		20043280	121_200CL2A004	Clean and Paint the welded part.	2 hrs	Tue 19/05/26 4:00 PM	Tue 19/05/26 6:00 PM
1471		**20043281**	**121_200CL2B004**	**REPLACE ELBOW SECTIONS DUE TO THINNING (SRG**	**11.5 hrs**	**Tue 19/05/26 2:00 PM**	**Wed 20/05/26 1:30 AM**
1472		20043281	121_200CL2B004	CUT AND REMOVE OLD SPOOL	3 hrs	Tue 19/05/26 2:00 PM	Tue 19/05/26 5:00 PM
1473		20043281	121_200CL2B004	INSTALL AND WELD NEW SPOOL	4.5 hrs	Tue 19/05/26 5:00 PM	Tue 19/05/26 9:30 PM
1474		20043281	121_200CL2B004	NDT to test the new welds on the spool.	2 hrs	Tue 19/05/26 9:30 PM	Tue 19/05/26 11:30 PM
1475		20043281	121_200CL2B004	Clean and Paint the welded part.	2 hrs	Tue 19/05/26 11:30 PM	Wed 20/05/26 1:30 AM
1505	**Startup**			**SD PACK: 3.6 - Common Oxidation**	**71 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Thu 21/05/26 5:00 AM**
1506		**20056324**	**7121_3PSV944**	**3PSV944 - redirect steam discharge pipe (SRG)**	**10 hrs**	**Wed 20/05/26 7:00 PM**	**Thu 21/05/26 5:00 AM**
1507		20056324	7121_3PSV944	replace discahrge spool	10 hrs	Wed 20/05/26 7:00 PM	Thu 21/05/26 5:00 AM
1773				**SD PACK: 5.3 - Cooling Water**	**69.75 hrs**	**Mon 18/05/26 9:30 PM**	**Thu 21/05/26 7:15 PM**
1774		**30182677**	**7121_D506**	**12Y Internal Statutory Inspection D506 (SRG)**	**26.5 hrs**	**Tue 19/05/26 2:45 PM**	**Wed 20/05/26 5:15 PM**
1776		30182677	7121_D506	VEOLIA Open Manway for STAT D506	1 hr	Tue 19/05/26 2:45 PM	Tue 19/05/26 3:45 PM
1780		30182677	7121_D506	VEOLIA Remove Insulation D506	2 hrs	Tue 19/05/26 2:45 PM	Tue 19/05/26 4:45 PM
1781		30182677	7121_D506	VEOLIA Disassemble for STAT D506	2 hrs	Tue 19/05/26 6:15 PM	Tue 19/05/26 8:15 PM
1782		30182677	7121_D506	SRG W/Brush Flanges & Corrosio STAT D506	2 hrs	Tue 19/05/26 6:15 PM	Tue 19/05/26 8:15 PM
1789		30182677	7121_D506	SRG External Paint Repairs	7 hrs	Wed 20/05/26 2:15 AM	Wed 20/05/26 9:15 AM
1792		30182677	7121_D506	SRG Replace Insulation D506	6 hrs	Wed 20/05/26 9:15 AM	Wed 20/05/26 3:15 PM
1813		**20021056**	**7121_F502A**	**F502A STRUCTURAL FRAME REPLACEMENT (SRG)**	**60 hrs**	**Tue 19/05/26 7:15 AM**	**Thu 21/05/26 7:15 PM**
1814		20021056	7121_F502A	RESCUE FRAME TO BE BUILT FOR CSE	3 hrs	Tue 19/05/26 7:15 AM	Tue 19/05/26 10:15 AM

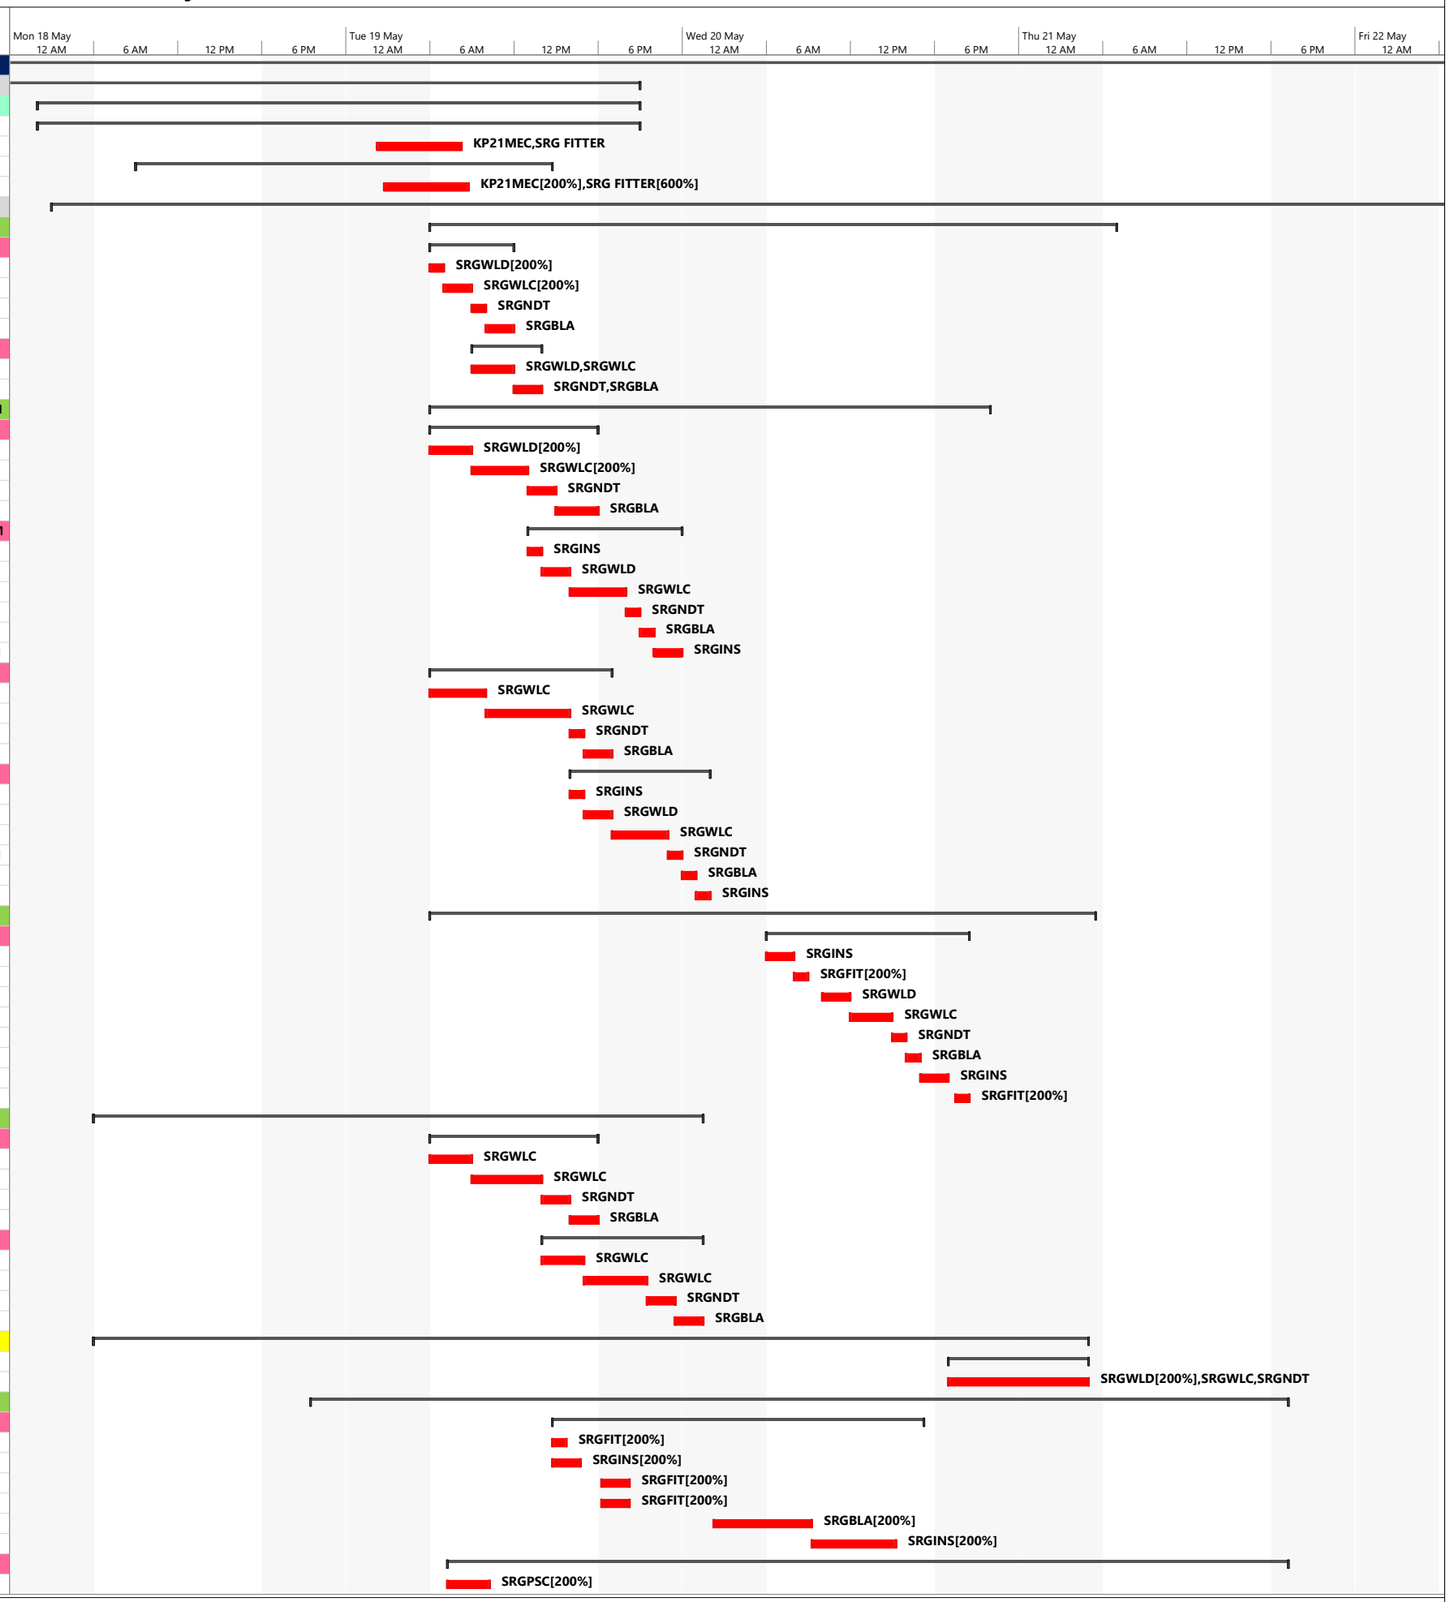

PS2026-1 May Shutdown Schedule
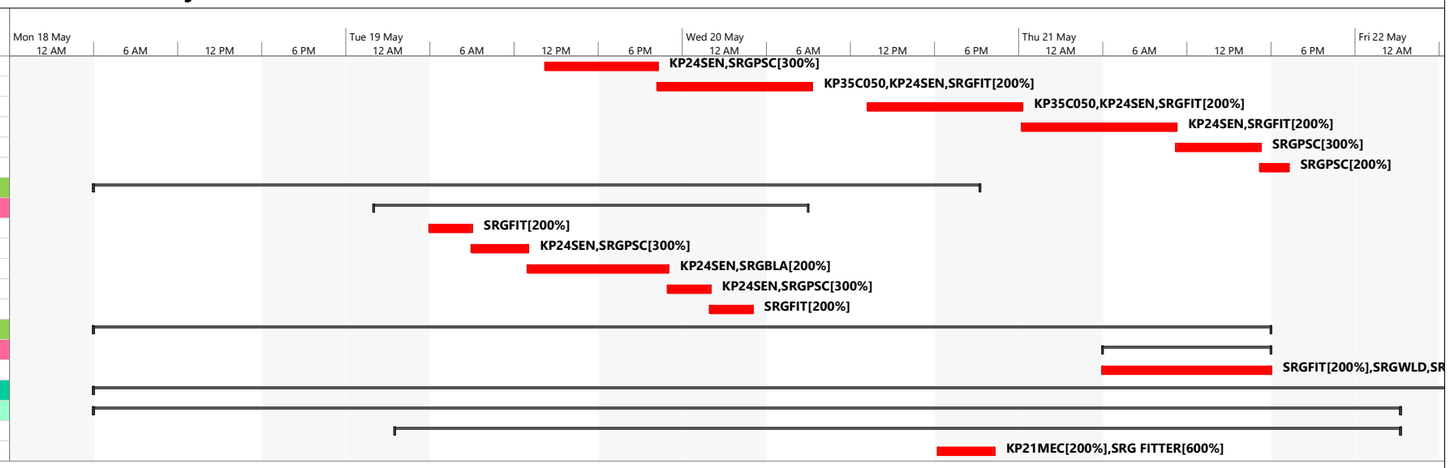
ID	Notes	Work Order	Equipment	Task Name	Duration	Start	Finish
1816		20021056	7121_F502A	SCAFFOLD REQUIRED TO REPLACE FRAMEWORK	8 hrs	Tue 19/05/26 2:15 PM	Tue 19/05/26 10:15 PM
1817		20021056	7121_F502A	F502A CW BASIN STRUCTURAL REPLACEMENT	11 hrs	Tue 19/05/26 10:15 PM	Wed 20/05/26 9:15 AM
1819		20021056	7121_F502A	F502A CW BASIN STRUCTURAL REPLACEMENT	11 hrs	Wed 20/05/26 1:15 PM	Thu 21/05/26 12:15 AM
1820		20021056	7121_F502A	F502A CW BASIN STRUCTURAL REPLACEMENT	11 hrs	Thu 21/05/26 12:15 AM	Thu 21/05/26 11:15 AM
1821		20021056	7121_F502A	SCAFFOLD REQUIRED TO BE REMOVED	6 hrs	Thu 21/05/26 11:15 AM	Thu 21/05/26 5:15 PM
1822		20021056	7121_F502A	RESCUE FRAME TO BE REMOVED	2 hrs	Thu 21/05/26 5:15 PM	Thu 21/05/26 7:15 PM
1835				**SD PACK: 5.5 - Steam & Incineration**	**63.25 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Wed 20/05/26 9:15 PM**
1836		**20042477**	**7121_X2256**	**X2256 Bottom section internal painting (SRG)**	**31 hrs**	**Tue 19/05/26 2:00 AM**	**Wed 20/05/26 9:00 AM**
1838		20042477	7121_X2256	OPEN MANWAY DOOR	3 hrs	Tue 19/05/26 6:00 AM	Tue 19/05/26 9:00 AM
1839		20042477	7121_X2256	BUILD INTERNAL SCAFFOLDING	4 hrs	Tue 19/05/26 9:00 AM	Tue 19/05/26 1:00 PM
1840		20042477	7121_X2256	X2256 Bottom section internal painting	10 hrs	Tue 19/05/26 1:00 PM	Tue 19/05/26 11:00 PM
1841		20042477	7121_X2256	REMOVE INTERNAL SCAFFOLDING	3 hrs	Tue 19/05/26 11:00 PM	Wed 20/05/26 2:00 AM
1842		20042477	7121_X2256	REFIT MANWAY DOOR	3 hrs	Wed 20/05/26 2:00 AM	Wed 20/05/26 5:00 AM
2009				**SD PACK: 6.3 - SR Recovery**	**84 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Thu 21/05/26 6:00 PM**
2010		**20057041**	**7121_F683**	**Refit Scheme water and air line replace (SRG)**	**12 hrs**	**Thu 21/05/26 6:00 AM**	**Thu 21/05/26 6:00 PM**
2011		20057041	7121_F683	Refit Scheme water and air line replace	12 hrs	Thu 21/05/26 6:00 AM	Thu 21/05/26 6:00 PM
2475				**Area 2 Start Up**	**110 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Fri 22/05/26 8:00 PM**
2476				**A2 Deisolations**	**93.25 hrs**	**Mon 18/05/26 6:00 AM**	**Fri 22/05/26 3:15 AM**
2500				**Unit 500 Deisolations**	**71.75 hrs**	**Tue 19/05/26 3:30 AM**	**Fri 22/05/26 3:15 AM**
2508		5, 20060718	7121_E5501E	Despade E5501 & E501	4 hrs	Wed 20/05/26 6:15 PM	Wed 20/05/26 10:15 PM
